

Eignasjóður – Fjárfestingar 2014

**VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA
JANÚAR-DESEMBER**



UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ - SKRIFSTOFA FRAMKVÆMDA OG VIÐHALDS

VINSEMD • SAMVINNA • HÓFSEMD • KRAFTUR



EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2014

Verkstöðuskýrsla nýframkvæmda janúar – desember 2014

Endurskoðuð fjárfestingaráætlun fyrir árið 2014 var samþykkt í borgarráði Reykjavíkur þann 14. ágúst 2014.

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	3.552.500
Til gatna- og umhverfisframkvæmda voru áætlaðar	2.587.500
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.225.000
Samtals fjárfestingaráætlun (brúttó)	8.365.000
Kostnaðarstaða miðast við 31. desember 2014.		
Raunútkoma ársins nemur samtals (brúttó).	7.481.819

EIGNASJÓÐUR

Verk- og kostnaðarstaða janúar-deseember 2014


	Kostn. staður	Endursk. áætlun *) 2014 (þús.kr.)	Raunkostnaður 2014 (þús.kr.)	Hlutfall útkomu af áætlun
Menningar- og ferðamálasvið	1103	469.500	451.934	96%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	1.837.000	1.881.692	102%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	741.000	774.170	104%
Velferðarsvið	1107	420.000	273.475	65%
Ýmsar fasteignir	1108	85.000	57.968	68%
Fasteignir og stofnbúnaður		3.552.500	3.439.239	97%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	165.000	92.248	56%
Nýbyggingahverfi	3104	410.000	256.463	63%
Endurnýjun í miðborginni	3105	500.000	432.762	87%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	850.000	645.211	76%
Umferðaröryggismál	3107	52.500	63.832	122%
Ýmsar framvæmdir	3108	610.000	546.123	90%
Götur		2.587.500	2.036.639	79%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	410*	236.000	244.380	104%
Áhöld, tæki og búnaður	2101	894.000	643.878	72%
Endurbætur og meiriháttar viðhald	710*	1.095.000	1.117.683	102%
Aðrar fjárfestingar		2.225.000	2.005.941	90%
Samtals fjárfesting (brúttó):		8.365.000	7.481.819	89%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-1.100.000	-1.204.299	
Samtals fjárfesting (nettó):		7.265.000	6.277.521	86%

*) Endurskoðuð fjárfestingaráætlun samþykkt á fundi borgarráðs 14. ágúst 2014.



Menningar- og ferðamálasvið 1103

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
20033	Kjarvalsstaðir	Ekki tókst að útvega hagkvæmt efni til endurnýjunar platna í kerfisloftum sýningarsala, áætlað er að endurmála núverandi plötur á næsta ári. Vinna hófst við endurnýjun og færslu raftöfluskápa í söllum og undirbúning fyrir aukna utanhússlýsingu.	10.000	1.263
20036	Borgarleikhús, búnaður	Endurnýjun fór fram á stjórnbúnaði flugkerfis og bætt við sex rafvindum fyrir þrívíddar flug. Sviðstjöld stórasviðs voru endurnýjuð og keyptur ýmiskonar sviðsbúnaður m.a. díóðukastarar og sviðsstjóraborð. Útljós og neyðarútgangar yfirfarin og endurnýjuð.	155.000	152.561
20037	Árbæjarsafn	Nýtt varðveisluhús á tveimur hæðum, alls 540 m ² . Framkvæmdir hófust í júlí. Áætluð verklok í ágúst/sept 2015.	90.000	65.379
20039	Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsi	Myndvöktunarkerfi í sýningarsöllum var endurnýjað.	10.000	4.149
20086	Landnáms-sýningin 871 +/-	Endurnýjun á tölvu- og margmiðlunarbúnaði. Endurbætur á öryggisbúnaði í tengslum við uppsetningu handritasýningar á vegum Árnastofnunar.	25.000	21.537
20094	Ásmundarsafn	Nýjar innréttingar hannaðar fyrir safnbúð. Smíði og uppsetningu var lokið í desember.	10.000	182
20114	Menningarmiðstöðin Gerðuberg	Breytingar og endurbætur fóru fram m.a. á aðstöðu veitingasölu og tengingu við Borgarbókasafnið. Framkvæmdir hófust í apríl og var þeim lokið í desember.	70.000	76.850
20135	Viðey - ferjuafgreiðsla.	Niðurstöður úr samkeppni um hönnun á nýrri ferjuafgreiðslu á Skarfabakka voru kynntar 19. júní. Hönnun og gerð útboðsgagna lokið. Framkvæmd frestað.	40.000	6.527
20195	Tjarnarbió, Tjarnargata 12	Kaup á ýmsum búnaði m.a. þráðlausum hljóðnemum, mini Mac og stálrennihurðum fyrir munageymslur. Undirbúningsvinna vegna óska um breytingar á sætapöllum í sal.	0	5.588
20282	Tryggvagata 15, Grófarhús	Í tengslum við fyrirhugaða viðbyggingu við Grófarhús og endurskoðun á ytra byrði hefur verið unnið að greiningu á nýtingu þess og væntanlegrar viðbyggingar. Sjá nánar í skýrslu vinnuhóps.	15.000	1.003
20829	Grandagarður 8, Sjóminjasafn	Bættar eldvarnir og innréttuð aðstaða fyrir nýja skrifstofu Borgarsögusafns. Framkvæmdir fóru fram í maí til desember.	27.500	96.233
20831	Hljómskálagarður	Nýr höggmyndagarður "Perlufestin" var settur upp til heiðurs formæðrum íslenskrar höggmyndalistar.	17.000	20.662
Samtals			469.500	451.934

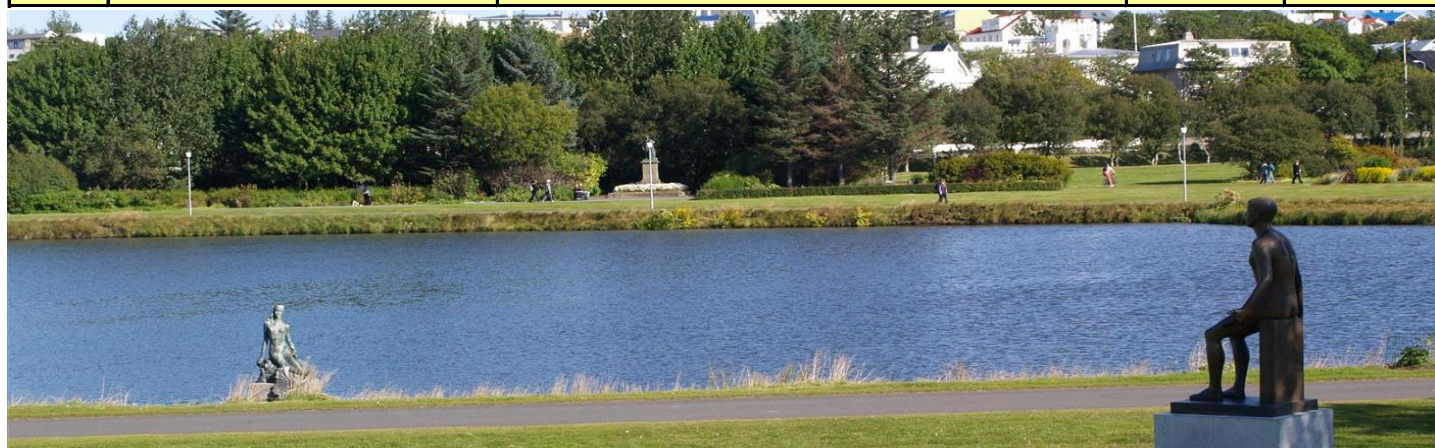

Skóla- og frístundasvið 1104 og 1106

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
1104				
20001	Austurbæjarskóli - "spennistöðin"	Innréttuð aðstaða fyrir félagsmiðstöð Austurbæjarskóla í fyrrverandi spennistöð OR. Framkvæmdum lokið.	63.000	65.554
20006	Breiðagerðisskóli, Breiðag. 20	Lokauppgjör .	10.000	9.732
20008	Foldaskóli	Engar framkvæmdir fóru fram á árinu aðeins greiðsla gjalda vegna lokaúttektar.	10.000	654
20030	Endurbygging skólalóða og boltagerði	Framkvæmdir fóru fram á lóðum Árbæjar- Breiða-gerðis-, Breiðholts-, Fossvogs- og Ölduselsskóla og nýtt boltagerði útbúið á lóð Kelduskóla. Gervigras með undirhita var lagt á boltavöll við Melaskóla.	345.000	379.028
20092	Safnliður, m.a. öryggis- og aðgengismál	Útbúin aðstaða fyrir einhverfa nemendur í Háleitisskóla, Húsaskóla, Vogaskóla og Dalheimum.	30.000	12.874
20140	Norðlingaskóli, Árvað 5	Ýmis frágangsværk við grunn- og leikskólabyggingu ásamt búnaðarkaupum. Lokaframkvæmdir á lóð.	100.000	121.922
20141	Sæmundarskóli Gvendargeisla 168	Ýmis frágangsværk við byggingu ásamt búnaðarkaupum. Lóðarframkvæmdir hófust í október en ekki náðist að ljúka þeim að fullu.	60.000	53.749
20142	Ölduselsskóli, Ölduseli 17	45 m ² stækkun á tengigangi og anddyri. Bætt aðgengi fatlaðra með útskábrautum og útilyftu. Framkvæmdir hófust í júní. Ekki náðist að ljúka verki að fullu.	60.000	75.593
20151	40% framlag til stofnframkv. framhaldsskóla	Kostnaðarþátttaka í um 2800 m ² viðbyggingu við Menntaskólann við Sund skv. samningi ríkis og borgar dags. 7.okt 2013.	250.000	265.296
20153	Vogaskóli, Ferjuvogur 2	340 m ² frístundaheimili á lóð Vogaskóla. Hönnun var lokið og útboð auglýst í nóvember. Áætluð verklok desember 2015.	60.000	26.028
20183	Vesturbæjarskóli, Sólvallagata 67	Undibúningur fyrir um 1400 m ² viðbyggingu. Forhönnun liggur fyrir. Gert er ráð fyrir frístundaheimili í núverandi húsi á lóðinni við mót Vesturvalla- og Sólvallagötu.	50.000	30.494
20247	Klettaskóli, Suðurhlíð 9	3.820 m ² viðbygging og breytingar á um 2.900 m ² í núverandi byggingu. Unnið að gerð útboðsgagna. Áætlað að útboð fari fram í feb/mars 2015.	150.000	188.776
20250	Leik- og grunnskóli við Úlfarsbraut	Tveggja þrepa hönnunarsamkeppni um samþættan leik- og grunnskóla, menningarmiðstöð, sundlaug og íþróttahús. Tillögum í fyrra þrepi var skilað 1. apríl og í seinna þrepi 14. október. Niðurstöður dómnefndar lágu fyrir 10. nóvember. Áætluð heildarstærð mannvirkja er um 15.500 m ² .	20.000	28.218
20283	Færanlegar kennslustofur	12 nýjar færanlegar stofur voru keyptar ásamt búnaði og settar niður á eftirtöldum stöðum: 3 við Dalskóla, 2 við Norðlingaskóla, 4 við Sæmundarskóla, 1 við Laugarnesskóla og 2 við Frostheima.	288.000	282.837
20284	Safnfrístund í Laugardal	Áður bækistöð garðyrkju, færanleg stofa og gæsluvallarhús voru tengd saman og mynda þannig samtals um 300 m ² frístundarymi fyrir börn úr Langholts- og Laugarnesskóla.	80.000	83.990
20285	Endurnýjun áhalda og tækja	Endurnýjun á aðstöðu mótuneytiseldhúsa í Brúarskóla og Grandaskóla auk tækja- og búnaðarkaupa var lokið á árinu.	82.000	62.733
20286	Hólmasel, frístundahús	Breytingar og endurbætur innanhúss, fyrri áfangi.	45.000	51.372
20700	FabLab			5.261

Skóla- og frístundasvið 1104 og 1106

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
1106				
20068	Endurgerð leikskólalóða	Endurgerð lóð við Stakkaborg. Framkvæmdum lokið.	60.000	60.070
20190	Safnliður - m.a. v/öryggismála	Nýr "matarstigur" var lagður milli Kvarnaborgar og Ártúnsskóla.	30.000	7.815
20287	Nýjar leikskóladeildir	Áætlun tók mið af fyrir-huguðum framkvæmdum á Slippasvæði en uppbyggingu seinkar.	0	0
20297	Steinahlíð, viðbótarhúsnæði	Gagnger endurnýjun innanhúss í 250 m ² húsnæði sem flutt var á lóðina.	44.000	69.694
Samtals			1.837.000	1.881.692



Íþrótt- og tómstundasvið 1105

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Framkvæmdir við 130 m ² móttöku- og miðasöluhús. Ekki tókst að ljúka verkinu að öllu leyti fyrir áramót. Undirbúningur fyrir starfsmanna- og fræðsluhús.	120.000	90.151
20043	Sundhöll Reykjavíkur v. Barónsstíg	Niðurstöður úr hönnunarsamkeppni voru kynntar í nóvember 2013. Unnið var að hönnun viðbyggingar og útisundlaugar. Áætlað að auglýsa útboð í febrúar 2015.	105.000	92.942
20046	Bláfjöll	60% kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar. Keyptur nýr snjótroðari.	45.000	36.810
20057	Sparkvellir í hverfum borgarinnar			844
20100	Eignir og vellir í Laugardal	Ýmis undirbúningur f. smáþjóðaleika 2015, kastsvæði við Laugardalsvöll. Listaverk, sem áður var á stúku við Laugardalsvöll, sett upp á Laugardalshöll.	74.000	64.756
20128	Þjónustumiðstöð við tjaldsvæði í Laugardal	Stækkun þjónustumiðstöðvar, 223 m ² nýbygging og 50 m ² verönd ásamt hellustétt næst húsi, framkvæmdum lauk á árinu.	85.000	91.727
20139	Íþróttamiðstöð Ármanns	Kaup á ýmsum fimleikabúnaði og undirbúningur fyrir lagfæringar í fimleikasal m.a. vegna Smáþjóðaleika 2015.	15.000	16.215
20180	Gufunesbær, Grafarvogi	Endurnýjun og tenging frárennslis á svæðinu. Dælubrunnur fyrir skolp settur upp. Frágangur og tenging raflagna á útisvæði.	20.000	20.040
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði (Fram)	Vinna við sigmælingar á framkvæmdasvæði sem er enn undir fargi. Hönnun íþróttasvæðis.	5.000	5.736
20248	Íþróttahús Austurberg	Kostnaður við vinnslu á efni í keramik veggmynd eftir Erró sem fram fer á Spáni. Áætluð uppsetning á næsta ári.	32.000	21.921
20257	Íþróttahús og sundlaug í Úlfarsárdal. Sjá einnig kst. 1104, verk nr. 20250	Tveggja þrepa hönnunarsamkeppni um samþættan leik- og grunnskóla, menningar-miðstöð, sundlaug og íþróttahús. Tillögum í fyrra þrepi var skilað 1. apríl og í seinna þrepi 14. október. Niðurstöður dómnefndar lágu fyrir 10. nóvember. Áætluð heildarstærð mannvirkja er um 15.500 m ² .	10.000	0
20262	Endurnýjun áhalda og tækja	Kaup á seglbátum og ýmsum búnaði fyrir íþróttahús (á vegum ÍTR).	20.000	32.863
20276	Sundlaugar, átaksverkefni	<u>Vesturbæjarlaug</u> : frágangsverk við nýjan pott, endurnýjun bað- og búningsklefa. <u>Laugardalslaug</u> : frágangsverk í búningsklefum og jarðvinna fyrir strandblak. <u>Breiðholtslaug</u> : eimbað uppgjör, endurnýjun ljósa í laugarkeri.	125.000	174.506
20279	Laugardalshöll	Lagfæringar á íþróttagólfi og endurnýjun á loftræsibúnaði.	60.000	61.505
20292	Skíðalyftur í hverfum	23 m ² hús var flutt úr Skerjafirði og sett niður við Jafnasel fyrir umsjónarmann skíðasvæðis.	10.000	12.615
20293	Strandblakvellir	Tillögugerð að staðsetningu strandblakvallar við Árbæjarlaug.	15.000	238
80008	Tæki húsdýragarður	Fallturn og rugguskip		51.300
	Samtals		741.000	774.170



Velferðarsvið 1107

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
20258	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	Tillögugerð að 24 m ² viðbyggingu við sambýlið Álfalandi 6. Kannað framtíðarfyrirkomulag og ástand á húsnæði fyrir skammtímavistun að Hólabergi 86.	80.000	0
20259	Gistiskýli að Lindargötu 48	600 m ² húsnæði á þremur hæðum var breytt í gistaðstöðu fyrir heimilisláusa. Rúm eru fyrir a.m.k. 20 manns. Húsnæðið var tekið í notkun 27. okt.	90.000	114.486
20275	Spöngin 43, félagsmiðstöð	1400 m ² bygging fyrir dagdeild eldri borgara, félagsstarf Korpúlfa og kirkjustarf í Grafarvogssókn. Vísla fór fram 27. apríl 2014 og hefur húsið fengið nafnið Borgir. Framlag úr framkv.sjóði aldraðra	250.000	222.340 -63.350
Samtals			420.000	273.475



Ýmsar fasteignir 1108

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
20090	Tjarnargata 12	Lagfæringar á aðstöðu borgarfulltrúa.	10.000	2.802
20238	Gröndalshús	Húsið er komið í umsjá Minjaverndar. Kostnaður opinber gjöld.	0	1.419
20278	Ráðhús	Breytingar á fyrirkomulagi innanhúss.	0	32.860
20296	Hverfastöðvar USK	Skipulagsbreytingar á fyrirkomulagi hverfastöðva hafa verið til skoðunar. Nokkrar endurbætur voru gerðar á aðstöðu verkbækistöðvar að Stórhöfða.	50.000	7.314
20501	Pönglabakki 4	Breytingar á húsnæði fyrir afnot Strætó bs.	15.000	13.573
20825	Varmahlíð 1 (Perlan)	Óvíst um framhald í ljósi samningsrofs ríkisins um Náttúrugripasafn.	10.000	0
	Samtals		85.000	57.968



Gatnagerðargjöld, fráveita stofnkostnaður 3100

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
30000	Gatnagerðargjöld			-254.660
30002	Heimæðagjald			-5.118
30003	Viðbótargatna-gerðargjöld			-944.521
	Samtals		-1.100.000	-1.204.299

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 3102

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
30204	Miðlæg umferðarstýring	Kaup og uppsetning á hugbúnaði. Samstarf Vegagerðar og Reykjavíkurborgar.	50.000	19.155
30217	Stórhöfði við Viðarhöfða, útvíkkun gatnamóta			103
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni.	Verkefni til að greiða fyrir umferð og bæta umferðaröryggi. Undirbúningi ekki lokið.	10.000	1.035
30230	Strætó forgangur og úrbætur	Samstarfsverkefni með Vegagerðinni, forgangur og endurbætur v. Strætó	50.000	32.043
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Vinna við undirbúning og forhönnun	20.000	14.629
30237	Fellsvegur	Vinna við undirbúning og forhönnun	5.000	5.575
30238	Reynisvatnsvegur	Framkvæmdum lokið.	15.000	14.864
30239	Laugalækur, við verslanir	Unnið var að undirbúningi og hönnun í samráði við lóðarhafa.	15.000	4.844
	Samtals		165.000	92.248



Nýbyggingahverfi 3104

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur.	Gönguleiðir, ræktun og frágangur á ýmsum stöðum m.a. í Spönginni, Breiðholtsbraut við Víkurhvarf og Geitastekk. Framkvæmdum lokið.	50.000	39.906
30406	Norðlingaholt	Ýmis frágangur í hverfinu, einkum gangstéttagerð. Framkvæmdir . Kostnaður við gangstéttar meðfram Norðlingabraut er færður á verk nr. 30617.	13.000	1.313
30409	Úlfarsárdalur	Ýmis frágangur í hverfinu, einkum gangstéttar og ræktun. Framkvæmdaáfangi lokið.	64.000	47.924
30412	Þétting byggðar	Undirbúningur og hönnun á Hlíðarendasvæði., Skuggahverfi, Einholt-Þverholt	30.000	43.690
30413	Hádegismóar	Sala lóða hefur ekki gengið eins og áætlað var og var framkvæmdum því frestað.	0	339
30423	Almannadalur		0	24
30425	Sléttuvegur - nýtt íbúðahverfi	Ýmis frágangur, einkum gangstéttar og ræktun. Framkvæmdir urðu minni en áætlað var.	13.000	2.113
30427	Reynisvatnsás	Ýmis frágangur í hverfinu, m.a. ræktun og stígagerð. Framkvæmdaáfangi lokið.	25.000	21.540
30433	NLSH	Í biðstöðu	10.000	0
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Gatnagerð samhliða uppbyggingu á lóð Alvogen. Uppgjöri ólokið á kostnaðarhlutdeild borgarinnar.	20.000	639
30437	Mýrargata - Slippasvæði	Uppbygging á svæðinu hefur tafist. Hér er m.a. færður kostnaður vegna undirstöðu og frágangs við útilistaverk frá CCP og umhverfisfrágangs vestast á svæðinu	20.000	12.301
30438	Lambhagavegur	Gatna- og stígagerð, verkinu er að mestu leyti lokið.	150.000	74.930
30439	Lambasel	Gangstéttar, ræktun og frágangur. Framkvæmdum er lokið.	10.000	6.754
30440	Hólaberg	Stígagerð, framkvæmdum lokið.	5.000	4.990
Samtals			410.000	256.463



Endurnýjun í miðborginni 3105

Verk. Nr.	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014	
30503	Harpa	Eftirstöðvar, uppgjör frá fyrra ári	0	1.613
30508	Pósthússtræti	Endurnýjun Pósthússtrætis norðan Austurstrætis, framkvæmdum lokið.	100.000	74.774
30509	Hverfisgata, endurgerð	Framkvæmdir á kaflanum frá Vitastíg að Snorrabraut að mestu lokið. Eftir er að leggja malbiksyfirlag milli Snorrabrautar og Barónsstígs auk gangstéttar og hjólastígs norðan götu við hótélbyggingu að Hverfisgötu 103.	350.000	337.184
30510	Þingholt, „torgin þrjú“	Undirbúningsvinna og hugmyndasamkeppni vegna fyrirhugaðrar endurgerðar.	20.000	5.446
30511	Klapparstígur	Framkvæmdir neðan Laugavegar, lokauppgjör.	0	3.520
30512	Laugavegur, endurbætur	Undirbúningsvinna og hugmyndasamkeppni vegna fyrirhugaðrar endurgerðar.	30.000	6.552
30513	Frakkastígur, endurgerð	Verkhönnun, kafli milli Njálsgötu og Lindargötu.	0	3.673
Samtals			500.000	432.762



Umhverfis- og aðgengismál 3106

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
30602	Gangbrautarljós	Endurnýjun gangbrautarljósa á Suðurgötu við Starhaga, Stekkjarbakka við Mjódd og á móts við Háaleitisbraut 23. Framkvæmdum að mestu lokið.	20.000	14.590
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum	Endurnýjun, að hluta til samhliða gerð hjólastíga, framkvæmdum að mestu lokið.	110.000	89.744
30605	Gönguleiðir skólabarna og aldraðra.	Ýmsar úrbætur á gönguleiðum skólabarna og aldraðra, framkvæmdum að mestu lokið.	70.000	58.833
30609	Ýmsar framkvæmdir.	Arnabakki - Núpabakki, breyting á gatnamótum, lokið.	30.000	1.382
30610	Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	Framkvæmdir við hjólastíga m.a. í Borgartúni, meðfram Sæbraut frá Faxagötu að Kringlum.braut, í Öskjuhlíð milli Flugvallarveggar og HR og meðfram Kringlumýrarbraut í Fossvogi og frá Laugavegi að göngubrú við Sóltún. Framkvæmdum lokið. Einnig gerð hjólastíga samhliða endurgerð gönguleiða í Stjörnugróf, við Háaleitisbraut og Suðurgötu-Einarsnesi, framkvæmdum að mestu lokið. Auk þess voru gerðar endurbætur á stíg við Gullinbrú.	350.000	315.771
30617	Breiðholtsbraut v. Norðlingaholt	Göngubrú yfir Breiðholtsbraut, samstarfsverk með Vegagerðinni. Framkvæmdir standa yfir og lýkur vorið 2015.	105.000	97.873
30618	Elliðaárósar, göngu- og hjólaleið	Framkvæmdir í samstarfi við Vegagerðina, verki lokið.	0	195
30619	Hjólastandar, hjólaskýli	Uppsetning hjólastanda m.a. í Grófinni og Lækjargötu. Framkvæmdum lokið.	5.000	3.674
30621	Strætóskýli, upphitun	Snjóbræðslukerfi voru lögð við biðstöðvar í Lækjargötu og í Austurbergi.	30.000	27.318
30624	Hofsvallagata	Undirbúningur og samráðsferli.	20.000	6.418
30625	Gönguleiðir og ræktun	Óákveðið	10.000	0
30626	Strætóskýli, endurnýjun	Samið var um smíði 10 nýrra skýla og undirbúin niðursetning þeirra.	20.000	3.552
30627	Ruslastampar	Nýjir ruslastampar.	5.000	5.558
30628	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	Unnið var að undirbúningi, samningum við landeigendur ekki lokið.	50.000	6.348
30629	Víkurvegur við Árleyni	Framkvæmdir við biðstöðvar Strætó, lokið.	10.000	9.075
30630	Sýningarstandar	Hönnun og gerð færanlegra sýningarstanda, hönnun lokið, 25 stk eru í framleiðslu.	15.000	4.880
	Samtals		850.000	645.211



Umferðaröryggismál 3107

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Áætlun útkoma
30703	Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	Framkvæmdir á ýmsum stöðum, framkvæmdum lokið.	52.500	61.183
30704	Hraðamyndavélar	Eftirstöðvar frá fyrra ári		2.649
	Samtals		52.500	63.832

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir 3108

Verk nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
30804	Eftirstöðvar frá 2013	Umferðarljós við Laugaveg, brú við Elliðaárósa, Skildingatangi-Baugatangi, Almannadalur lýsing, F'kur Víðidal.	0	9.908
30812	Ýmsar framkvæmdir	Frágangur við Fylkisstúku, Hagamelur stoðveggur.	0	15.085
30814	Götulýsing, endurnýjun	Endurnýjun ljósastólpa, ljósabúnaðar og götuljósaskápa.	100.000	110.045
30815	Umferðarljós	Eftirstöðvar	0	128
30817	Malbiksyfirlög	Ný malbiksyfirlög, framkvæmdum lokið.	150.000	150.424
30832	Malbik endurgerð	Endurnýjuð malbiksyfirlög, framkvæmdum lokið.	150.000	150.424
30840	Bryggjuhverfi	Innsiglingarljós, dýpkun innsiglingarrennu. Verkefni í biðstöðu	20.000	611
30843	Sorpílát	Kaup á tunnum.	20.000	11.750
30846	Grenndarstöðvar	Kaup á grenndargámum boðin út í október. Mögulegar staðsetningar m.a. við Hrannarstíg, Laugalæk og Freyjutorg. Framkvæmdir hófust við stækkun nokkurra grenndarstöðva vegna glergáma.	20.000	6.014
30847	Hljóðvarnir	Undirbúningur	5.000	2.497
30848	Grasagarður	Endurbygging fjölæringabeða og uppeldisreita.	5.000	7.295
30849	Klambratún	Áframhaldandi endurbætur á leiksvæði, aðgengi bætt. Verki lokið.	15.000	15.411
30850	Gufunes, útivistarsvæði	Uppbygging fjölskylduleiksvæðis og frágangur mana austast á svæðinu og bygging leikborgar.	20.000	5.389
30851	Hljómskálagarður	Lagfæring umhverfis stytta Bertil Thorvaldssen. Er lokið	10.000	11.556
30852	Reykjavíkurtjörn	Endurhleðsla á kanti við Tjarnargötu og aðgerðir vegna varps á tjarnarbakka. Er lokið.	10.000	8.345
30853	Vatnsmýri	Jarðvinna í friðlandinu, stígar og smíði göngubrúa. Smíði uppeldiskofa fyrir æðarunga. Verki lokið	10.000	3.129
30854	Önnur svæði	Endurnýjun leiksvæða við Álagranda 12, Hverafold 68, og Fífusel 25. Framkvæmdir er að mestu lokið.	45.000	37.458
30855	Tækjakaup	Fjárheimild flutt á kostn.stað 2101	0	0
30856	Undirbún. næsta árs verkefna		30.000	655
	Samtals		610.000	546.123



Áhöld, tæki og hugbúnaður 2101

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
20157	Borgartún 12 - 14	Breytingar í þjónustuveri, flutningur á símaveri og skrifstofum.	50.000	54.509
80001	Hugbúnaður UTM	Stofnhugbúnaður	150.000	135.296
80002	Kaup á bifreiðum	Eftirstöðvar frá fyrra ári	95.000	1.861
80004	Myndavélakerfi í miðborginni		0	1.373
80008	Ýmis tæki	Kaup á ýmsum tækjum m.a. sláttuvélar og gróðurhreinsunartæki, loftgæðamælistöð og stýrikerfi fyrir gróðurhús.	42.000	36.874
80009	Tölvubúnaður	Endurnýjun notendabúnaðar	350.000	264.393
80010	Sorpbílar	Kaup á þremur sorphirðubílum	207.000	149.571
	Samtals		894.000	643.878



Lóðir, lönd og skipulagseignir 4101 og 4102

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
4101				
20261	Mýrargata/Slippasvæði		0	10.494
20281	Ný byggingarsvæði, þróunarverkefni	Undirbúningsvinna vegna Hlíðarenda, Vogabyggðar og ýmissa annarra uppbyggingar verkefna færð á biðreikning	65.000	62.486
		Samtals 4101	65.000	72.981
4102				
20211	Austurstræti 22/Lækjargata 2	Innréttingar fyrir Listdansskólann.		73.845
20211	Austurstræti 22/Lækjargata 2	Kostnaður færirst hjá Jörundi ehf.		-73.845
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Víðines, Sævarhöfði 31, Stakkholt 3.	121.000	128.055
20260	Grandagarður 2	Utanhússviðgerðir, þak, veggir og gluggar. Hluti heildarverks sem ekki tókst að ljúka á árinu 2013.	45.000	40.919
20277	Samgöngumiðstöð, Vatnsmýrarvegur 10	Vinnuhópur um U reit	5.000	2.405
20832	Hverfisgata 61, flutningshús	undirbúningur vegna flutnings		20
		Samtals 4102	171.000	171.400
	Samtals		236.000	244.380



Endurbætur-meiriháttar viðhald-átaksverkefni 7101 og 7102

Verk. Nr.	Verkheiti	Verkefni / Verkstaða	Áætlun 2014	Raunkostn 2014
7101				
20236	Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna	Viðhald á ýmsum fasteignum borgarinnar	800.000	673.976
		Samtals 7101	800.000	673.976

7102

20240	Leikvellir, torg og opin svæði.	Endurgerð leiksvæða við Drekvog, Meðalholt, Auðarstræti og Bríetartún. Framkvæmdir við torg í biðstöðu. Umhverfisfrágangur í Úlfarsfelli.	120.000	124.284
20249	Betri hverfi "hverfapottar"	Framkvæmd verkefna skv. íbúakosningu um "Betri Hverfi".	150.000	296.680
20295	Staðarnet Reykjavíkur	Um er að ræða lagningu ljósleiðara milli nokkurra stofnana í Árbæjarhverfi og Vesturbæ.	25.000	22.743
		Samtals 7102	295.000	443.707
	Samtals		1.095.000	1.117.683

