


## Verkafangi 2

Unnið að rífi og tvöföldun á stígum frá rampi af Kringlumýrarbraut upp á Bústaðarveg (ekið suður eftir Kringlumýrarbraut) og suður að stígamótum eftir undirgöngin.

Tré fjarlægð við þverun.

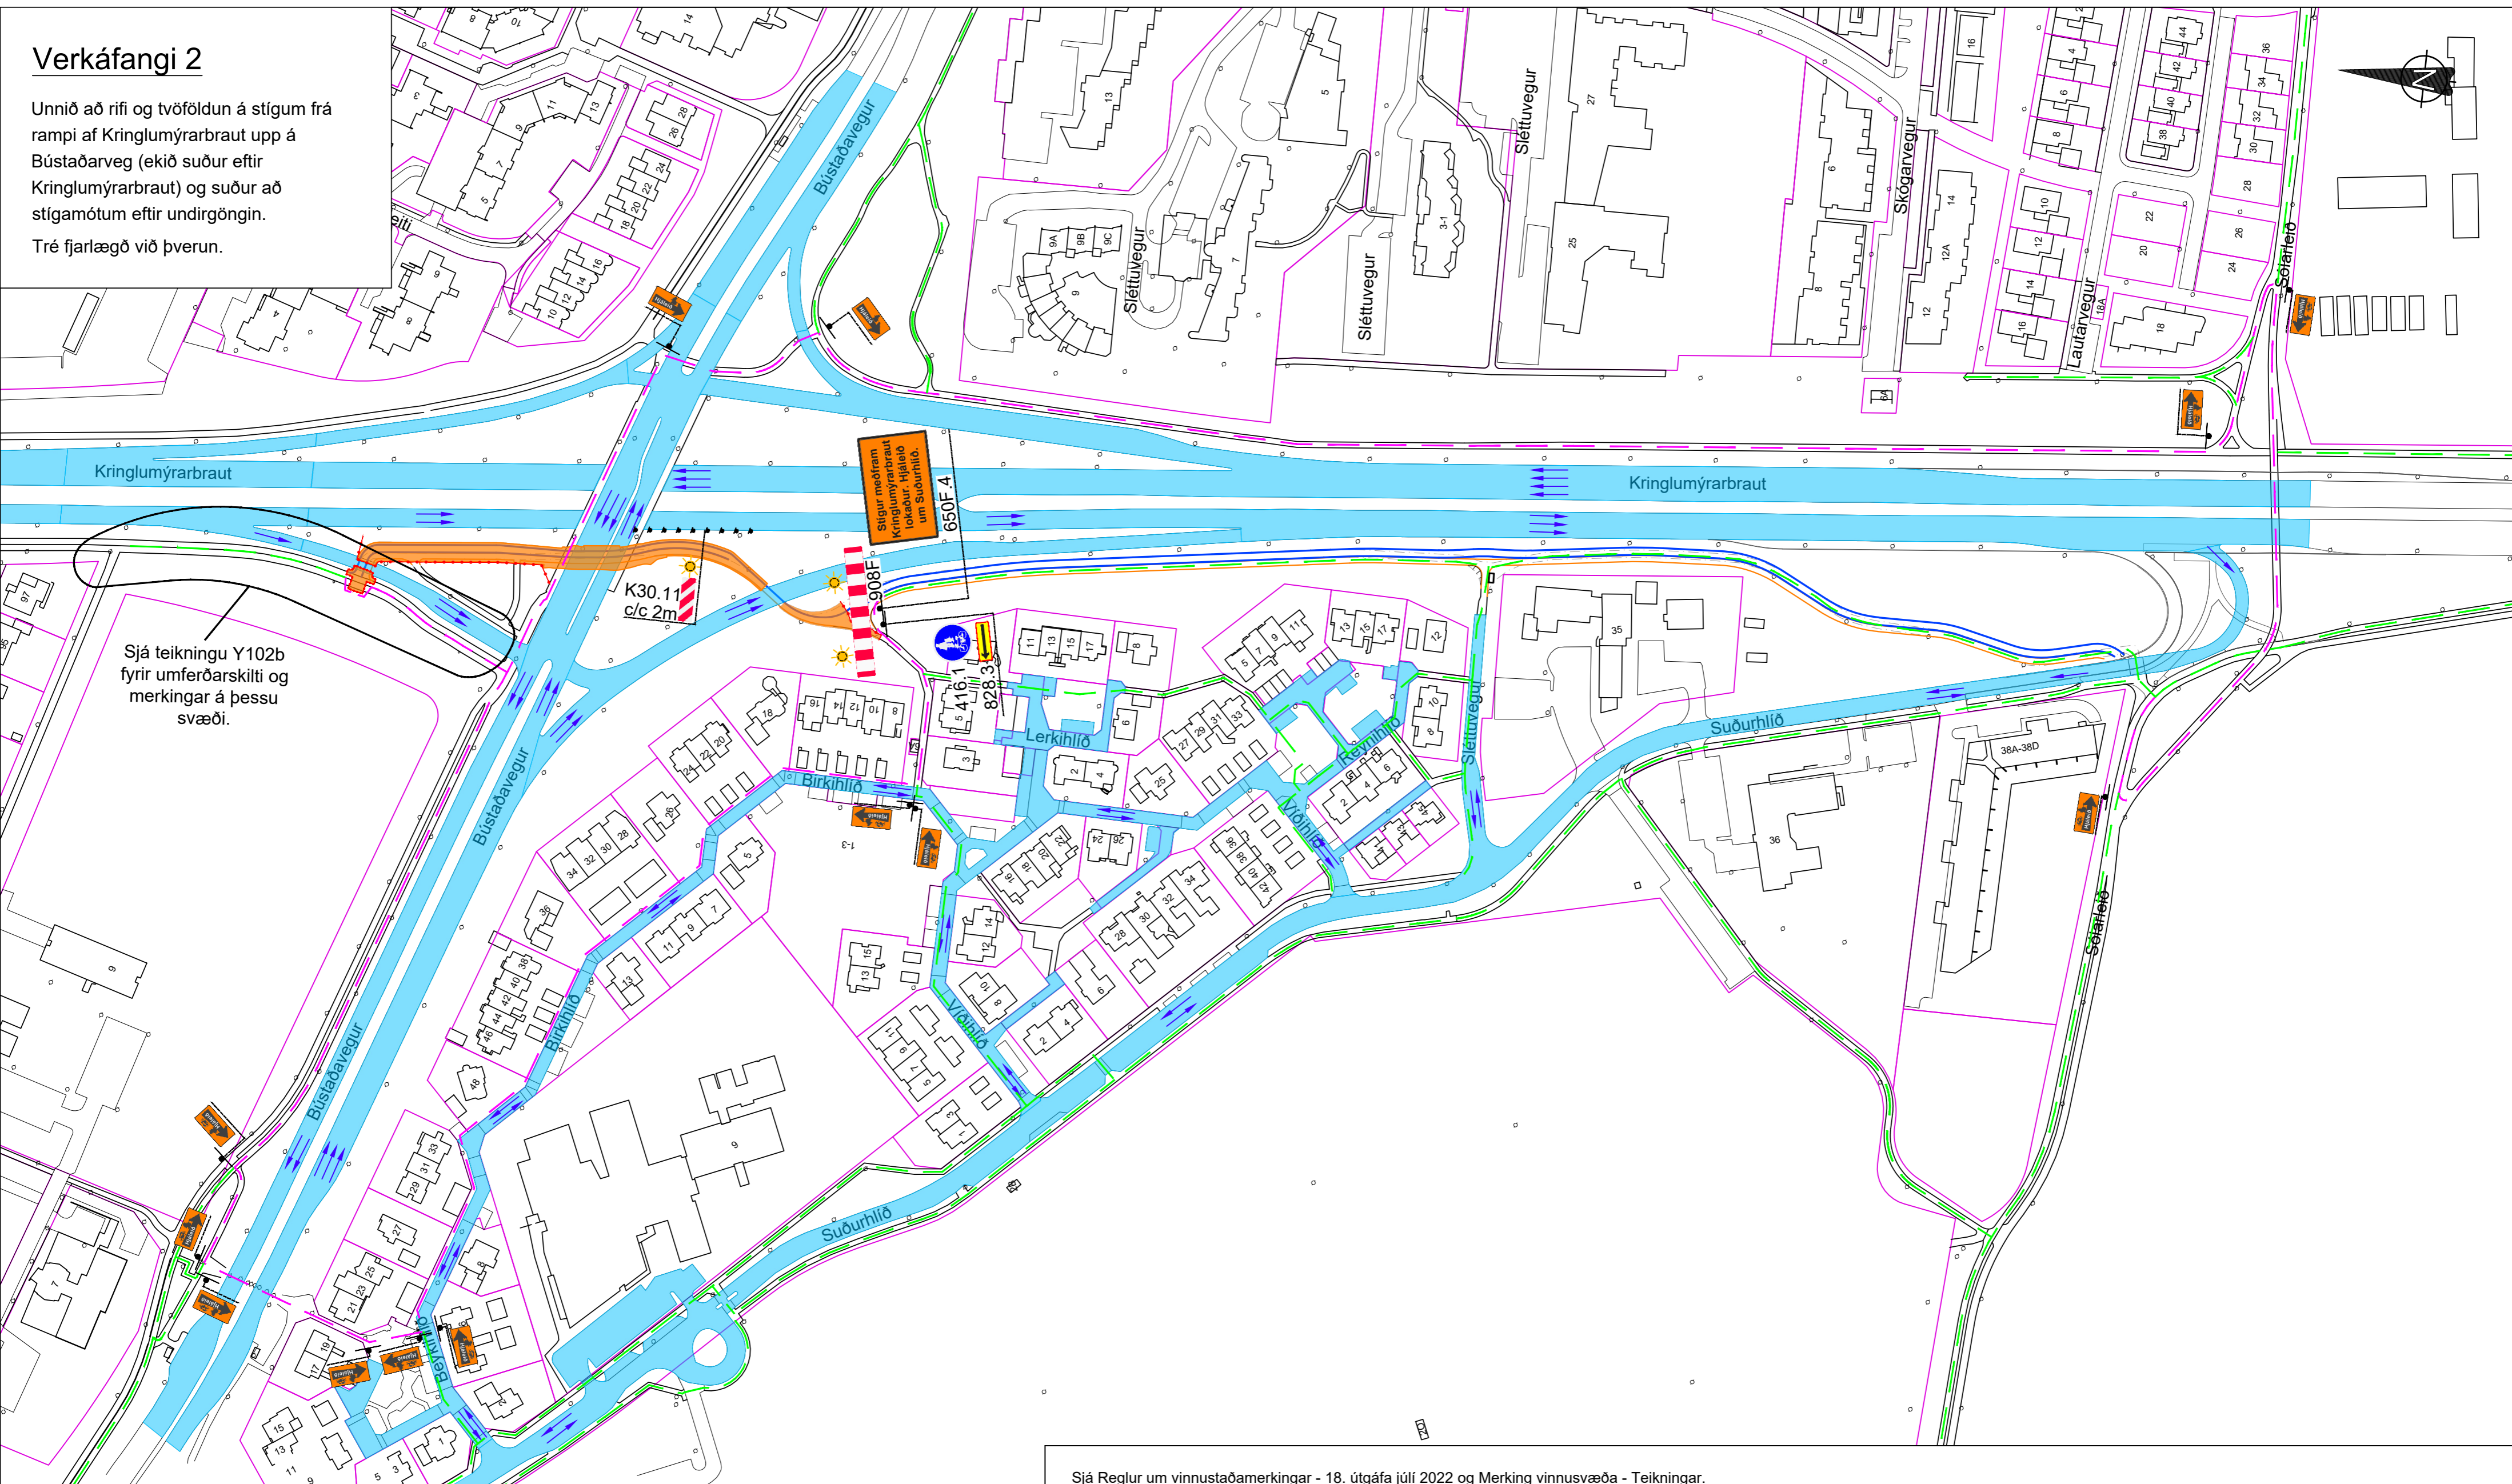

Sjá teikningu Y102b fyrir umferðarskilti og merkingar á þessu svæði.

Stígur meðfram Kringlumýrarbraut lokabur. Afleið um Suðurlíð.


K30.11 c/c 2m

650F.4

Sjá Reglur um vinnustaðamerkingar - 18. útgáfa júlí 2022 og Merking vinnusvæða - Teikningar.

Aldrei skal þrængja akreinar þannig að þær verði mjörri en 3,0 m.

Verktaki skal gera ráð fyrir að breyta þurfi merkingum eftir þeim aðstæðum sem upp kunna að koma frá degi til dags með tilliti til umferðaröryggis.



### SKÝRINGAR VINNUSVÆÐAMERKINGA:

- Samsíða létt vörn, kantstíkur (a ≤ 6 m) gátskildir (a ≤ 25 m)
- Vinnusvæði
- Umferð ökutækja
- Umferð gangandi
- Aðalleið fyrir hjólandi og hjáleið fyrir gangandi á meðan framkvæmd stendur yfir.

### SKÝRINGAR:

- Núv. götukantar
- Núv. gangstígur
- Nýr hjólastígur
- Nýr gangstígur
- Lóðarmörk
- Verkmörk

Hnitakerfi Reykjavíkur

Nr.	Dags.	Breyting	Af	Mkv.
B	06.12.23	Áföngum breytt	AR	Mælt: AR
A	04.12.23	Verkteikning	AR	Hannað: HHG / YC
				Teiknað: AR
				Yfirfarið: BV
				Mkv. 1:1750 (A2)

**VBV** VERKFRÆÐISTOFA  
BJARNA VIÐARSSONAR  
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi  
588 6288 · vbv@vbw.is · vbv.is

**Reykjavíkurborg**  
Umhverfis- og skipulagssvið

Suðurlíðar Bústaðavegur - Fossvogur  
Göngu- og hjólastígar  
Vinnusvæðamerkingar - Verkafangi 2

15.09.2023

Y102
