



Verkafangi 1

Unnið að rífi og tvöföldunar á stig frá stígamótum við undirgöng að þverun við Suðurhlíð.

Griðhleðsla fjarlægð við enda Sléttuvegar.

Undirstöður og uppsetning hjólagirðingar.


Tré fjarlægð eða færð eins og við á.

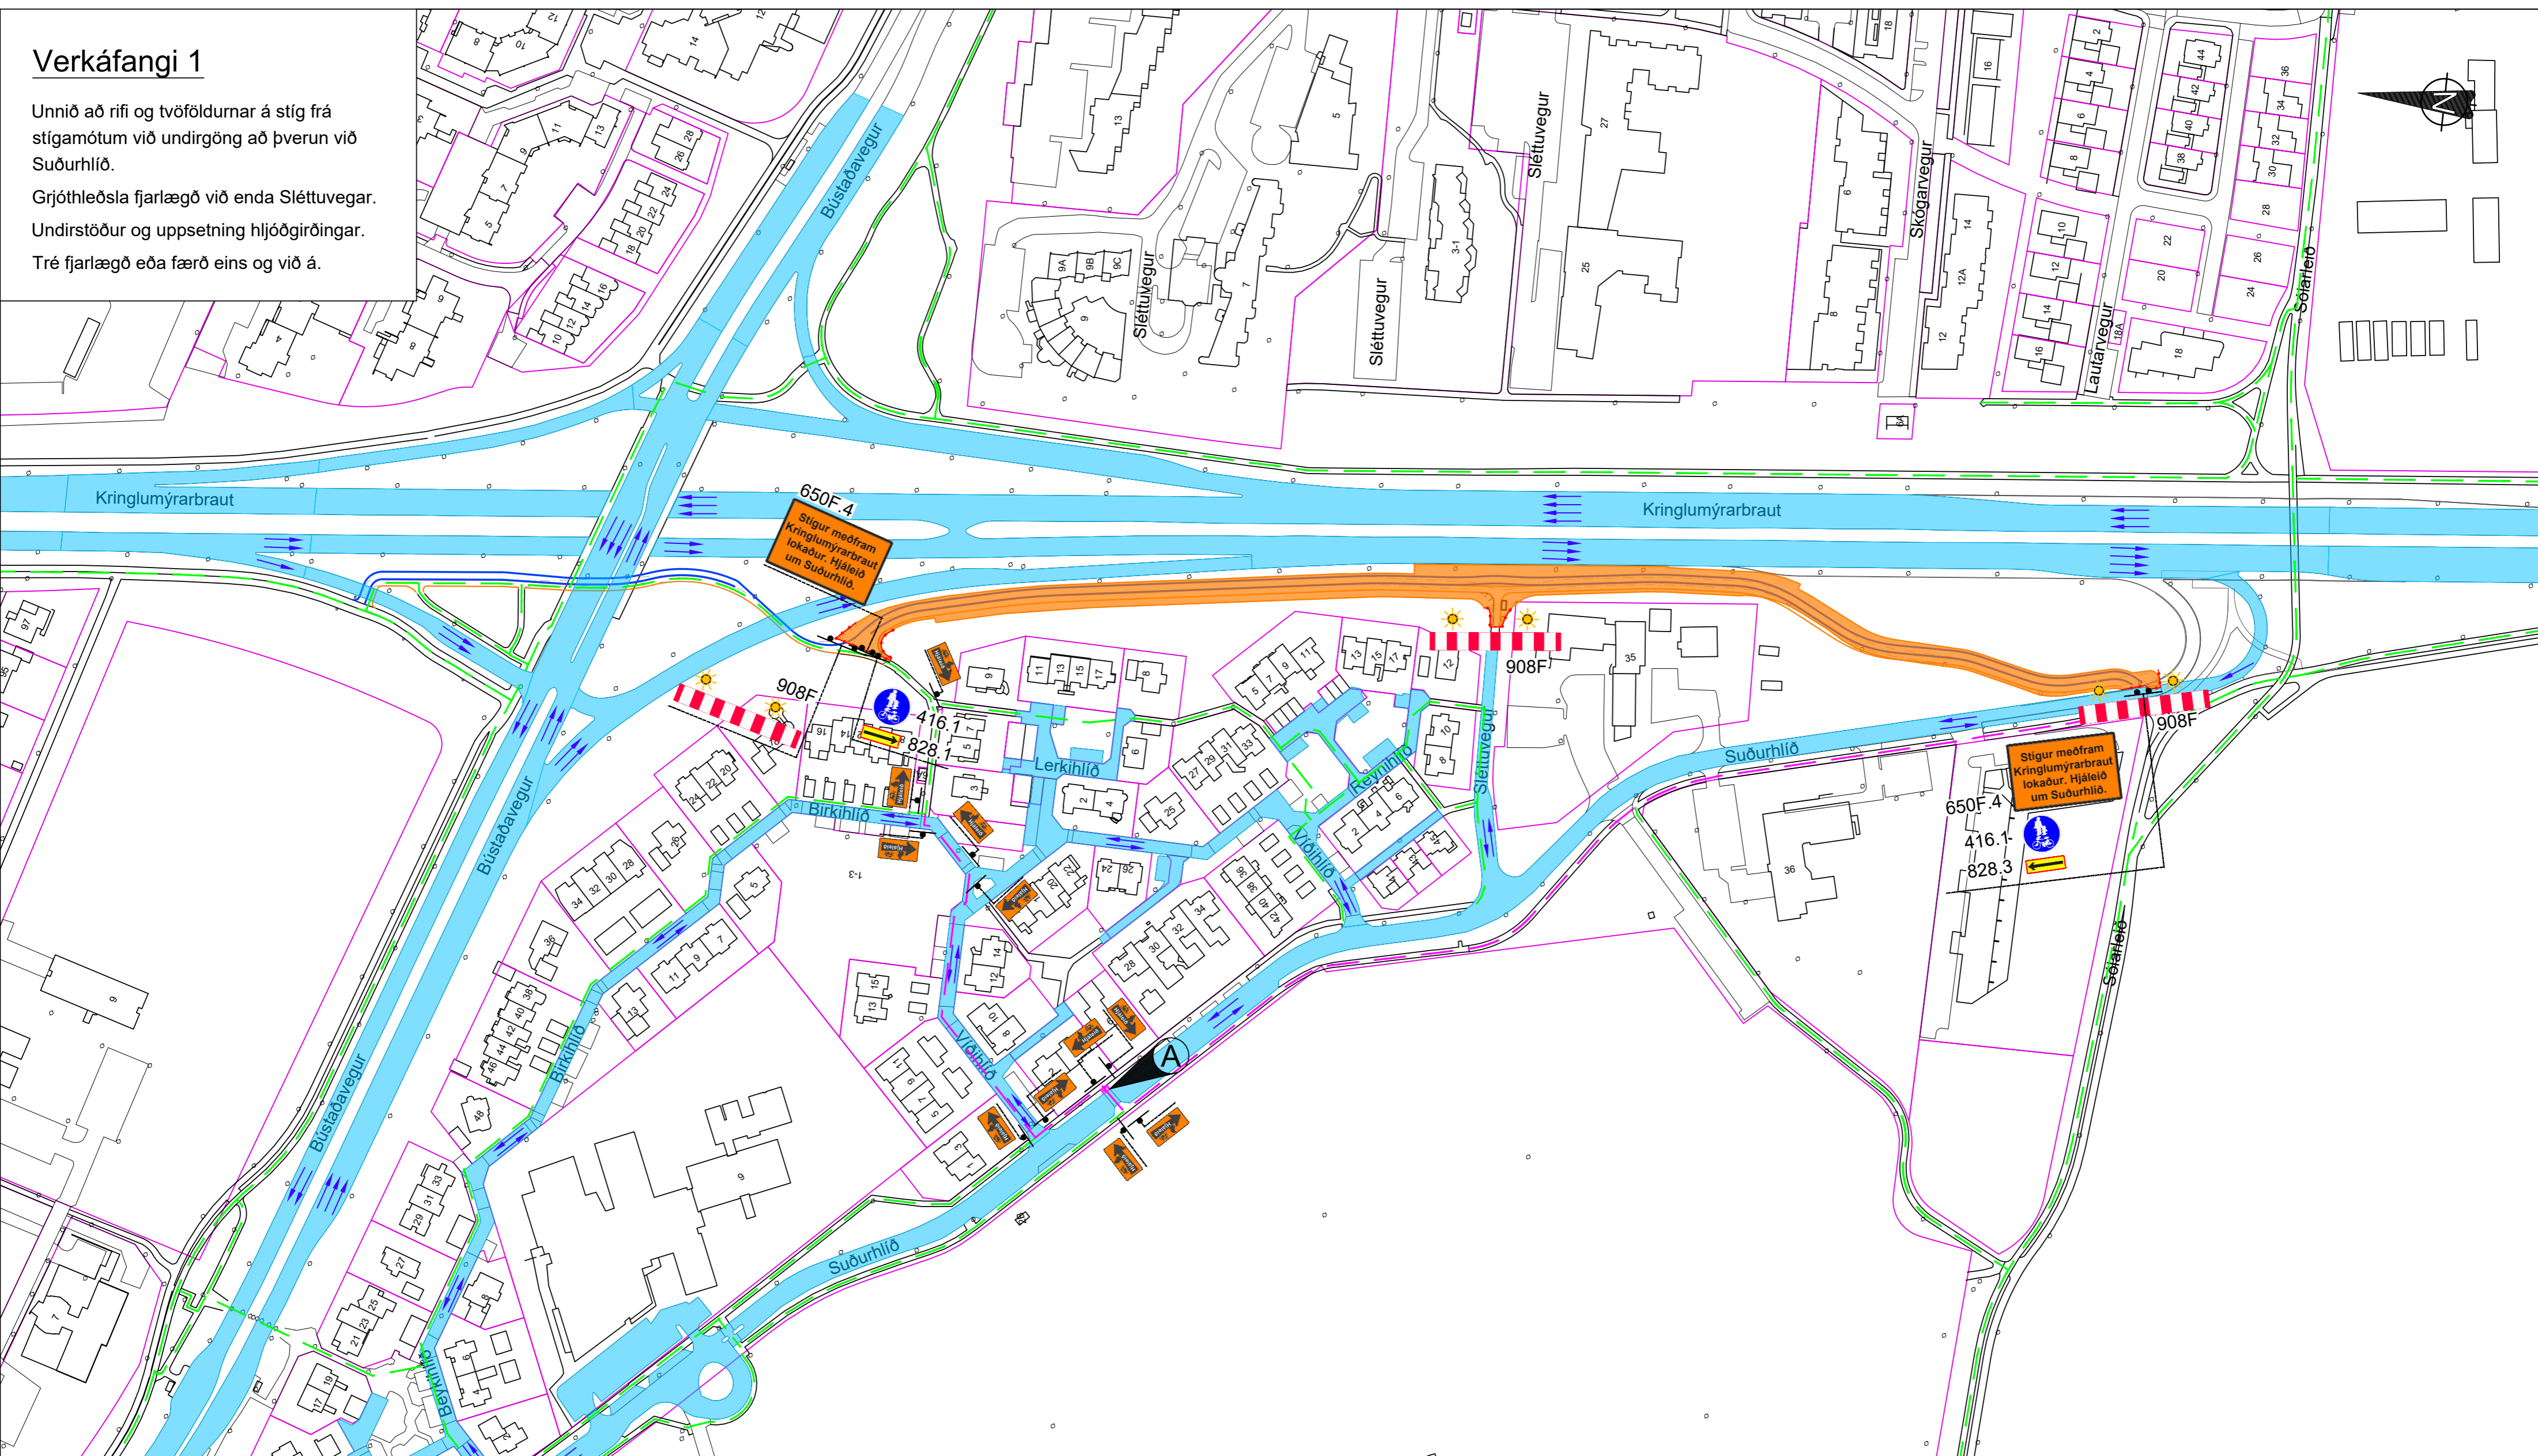

Sjá Reglur um vinnustaðamerkingar - 18. útgáfa júlí 2022 og Merking vinnusvæða - Teikningar.

Aldrei skal þrengja akreinar þannig að þær verði mjörri en 3,0 m.

Verktaki skal gera ráð fyrir að breyta þurfi merkingum eftir þeim aðstæðum sem upp kunna að koma frá degi til dags með tilliti til umferðaröryggis.



SKÝRINGAR VINNUSVÆÐAMERKINGA:

- Samsíða létt vörn, kantstíkur (a ≤ 6 m) gátuskildir (a ≤ 25 m)
- Vinnusvæði
- Umferð ökutækja
- Umferð gangandi
- Aðalleið fyrir hjólandi og hjáleið fyrir gangandi á meðan framkvæmd stendur yfir.

SKÝRINGAR:

- Núv. götukantar
- Núv. gangstígur
- Nýr hjólastígur
- Nýr gangstígur
- Lóðarmörk
- Verkmörk
- Útbúa fast yfirborð á grasi til að auðvelda þverun.



Hnitakerfi Reykjavíkur

B	06.12.23	Áföngum breytt	AR	Mælt:	Teiknað: AR
A	04.12.23	Verkteikning	AR	Hannað: HHG / YC	Yfirfarið: BV
Nr.	Dags.	Breyting	Af	LAY_Y_101048_Vinnusv.merkingar.dwg	Mkv. 1:1750 (A2)

VBV VERKFRÆÐISTOFA
BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbw.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Suðurhlíðar Bústaðavegur - Fossvogur
Göngu- og hjólastígar
Vinnusvæðamerkingar - Verkafangi 1

15.09.2023

Y101
